



Cours Pilotage de la performance

Cours de tronc commun M1
S07 2025-2026

Responsable de cours :
Isabelle LACOMBE

Enseignant :
Renato PEREIRA
renato.pereira01@em-normandie.fr



Plan du cours Pilotage de la Performance

1- Introduction

- 1.1 Définition du pilotage de la performance
- 1.2 Liens entre comptabilité de gestion et comptabilité générale
- 1.3 La gouvernance d'entreprise et le contrôle de gestion. Le pilotage stratégique
- 1.4 La notion de groupe, les cessions internes et management fees (frais de siège)

2- Suivi de la masse salariale et contrôle de gestion sociale

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

- 3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast
- 3.2 Le cycle et le calendrier budgétaire
- 3.3 Le contrôle budgétaire

4- Tableaux de bord et indicateurs et reporting

5- Plan de performance, lean management, la gestion de la croissance. Gestion du périmètre de l'entité

6- Conduite du changement

7- Le contrôle de gestion et la RSE

- 7.1 De la finance verte à la finance RSE durable
- 7.2 La performance extra-financière : la taxonomie et les ratios verts, le reporting de durabilité (CSRD), le bilan carbone

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast

Gouverner, c'est prévoir. Différentes méthodes existent

- De simulations ad hoc
- Le business plan
- Le rolling forecast
- Le budget base zéro
- Le beyond budgeting
- Le budget traditionnel

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast

Le modèle de simulation

- est une représentation d'une problématique complexe que l'on désire étudier, afin d'en permettre la communication, le travail en groupe, et de faciliter la prise de décision. Une fois le problème bien défini, le modèle met en exergue les relations de causes à effets entre différentes variables. Une fois le modèle réalisé, il est alors possible de tester différents scénarios autant de fois que souhaité. Un modèle dans le domaine du contrôle de gestion a généralement une traduction sous forme informatique, mais des graphiques ou des algorithmes peuvent suffire

Source : Selmer, 2024

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast

Le business plan

- le business plan, aussi appelé « plan d'affaires », est un guide pour la planification stratégique d'une entreprise. Il détaille les objectifs, les stratégies pour les atteindre, ainsi que les ressources nécessaires.
- Il présente une projection des flux de trésorerie, aidant à évaluer la viabilité financière du projet. Le business plan sert à comprendre comment créer et maximiser la valeur pour les clients, pour les parties prenantes et pour l'actionnaire
- Le business plan est un outil d'information stratégique et financier complet Il fournit une série d'informations et d'indications sur un projet entrepreneurial, quel qu'il soit. Un business plan est « une feuille de route », il définit où et comment une activité peut se développer; Il détaille la mission, la vision, les objectifs à long terme et les stratégies pour les atteindre

Source : Ristori, 2024

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast

Le rolling forecast

- consiste à réévaluer régulièrement les objectifs financiers (résultat, cashflow) arrêtés en début d'exercice, en tenant compte des changements les plus récents, de la conjoncture économique et des performances opérationnelles récemment réalisées. Les prévisions glissantes sont réalisées tous les trimestres sur 6 trimestres roulants : 1 trimestre réel et 5 trimestres estimés. Les chiffres des 4 trimestres de N+1 prévus lors du rolling forecast de décembre N (cible) servent de base pour la définition des objectifs qui serviront de référence pour l'attribution des primes variables de N+1.

Source : Selmer, 2024

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast

BBZ (Budget Base Zéro), une méthode qui ne s'ancre pas sur le passé

- méthode mise au point dans les années 80 pour contenir la croissance des frais de structure et de support (frais indirects). Elle a été expérimentée chez Texas Instruments
- Principe selon son initiateur (P. Pyhrr) exposant que :
 - Chaque dirigeant « justifie dans le détail et dès son origine (d'où l'intitulé base zéro) tous les postes de budget dont il a la responsabilité et qu'il donne la preuve de la nécessité d'effectuer cette dépense »,
 - « Plutôt que de procéder à des replâtrages incessants du budget existant ».
- BBZ, le budget Base zéro (ou Zero Based Budgeting) est une déclinaison de l'élaboration budgétaire très adaptée et répandue dans :
 - Les services fonctionnels d'entreprise, et d'état major (groupes)
 - Dans toutes les administrations, voire les programmes économiques de développement d'une région du monde

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast


Le Beyond Budgeting ou la gestion sans budget

- Un constat : le budget ne permet pas de :
 - Faire du manager un véritable entrepreneur
 - Limiter la triche institutionnalisée
- Certaines entreprises ont abandonné depuis plus de trente ans le rituel budgétaire : les premières sont scandinaves et partagent une culture d'entreprise fondée sur le **dialogue** et la **confiance**
- Elle requiert **l'exemplarité** totale des **dirigeants**
- Elle peut être **déstabilisante**
- Elle implique une **remise en cause permanente** des différents acteurs
- Certaines structures ne supportent pas un fonctionnement en **îlots d'entrepreneurs**

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast

Le positionnement du budget dans le cycle de gestion

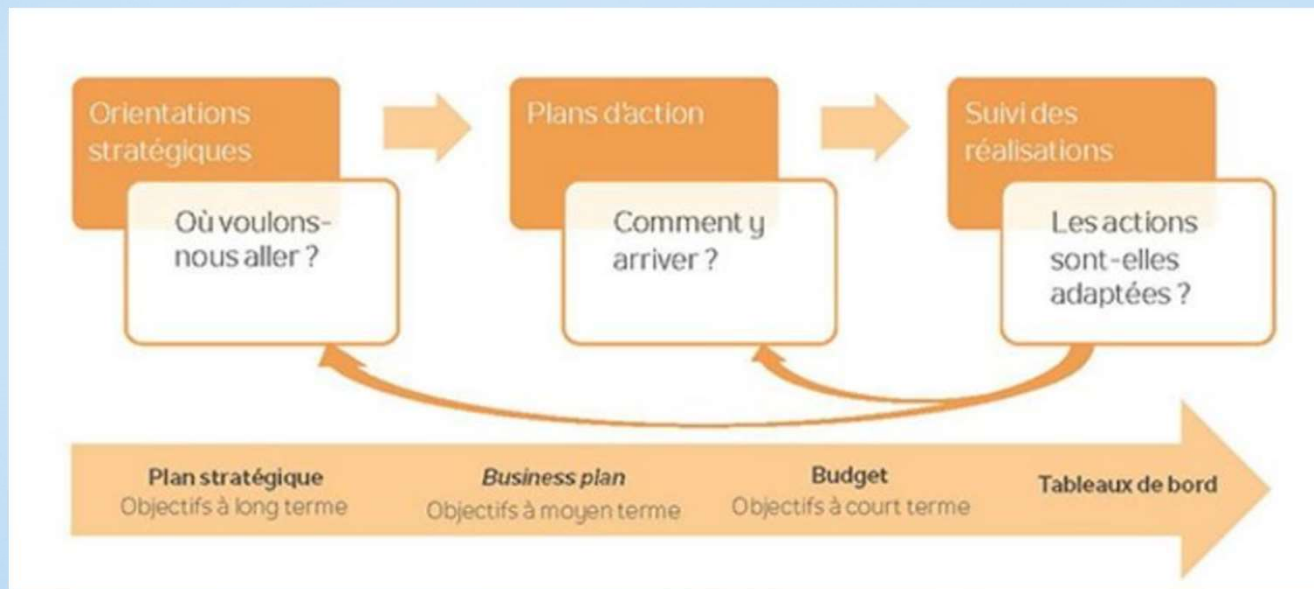

Source : Selmer, 2024

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.1 Le modèle de simulation, le business plan, le budget, le rolling forecast


Exemple d'outil de contrôle de gestion favorisant la délégation et la décentralisation :

- Le budget:
 - un **outil de prévision** (notamment du résultat).
 - Une **attribution d'objectifs et de moyens**. La démarche doit être dynamique et volontaire, ce n'est pas l'attribution d'enveloppes de dépenses.
 - Un **outil de délégation et de motivation**, d'évaluation des performances.
 - Un **outil de coordination et de communication** ; notamment pour s'assurer de la cohérence entre objectifs individuels et objectif global. Par ailleurs, le travail de préparation du budget renforce la communication horizontale et verticale. L'encadrement intermédiaire s'engage sur des objectifs qu'il s'est approprié, une partie de sa rémunération pourra être conditionnée par l'atteinte de ces objectifs.
 - Un **outil d'optimisation des choix**.
 - Le **contrôle budgétaire** par la confrontation périodique des réalisations avec le budget, mettant en évidence des écarts et permettant toutes mesures de régulation pour les écarts remarquables (gestion par exception).
 - Les budgets peuvent être établis en fonction de différentes hypothèses d'activité. On parle alors de budgets flexibles.

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.2 Le cycle et le calendrier budgétaire

Procédure d'élaboration du budget

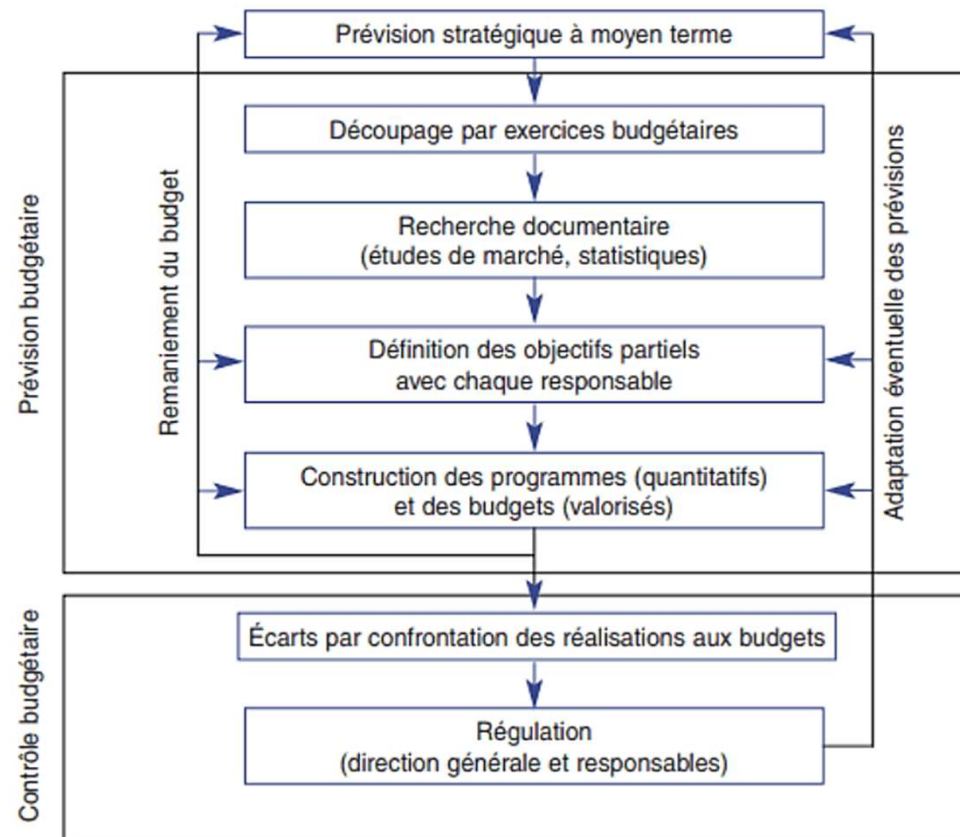


3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.2 Le cycle et le calendrier budgétaire

- Le budget est un processus itératif avec une consolidation selon différents niveaux hiérarchiques. Ces itérations prennent la forme d'une approche top-down et bottom-up.
- Les niveaux de consolidation dans des approches top-down et bottom-up

Approche top-down : budget élaboré par la direction et imposé aux managers. Approche directive permettant d'aller vite mais pouvant dévaloriser les managers.

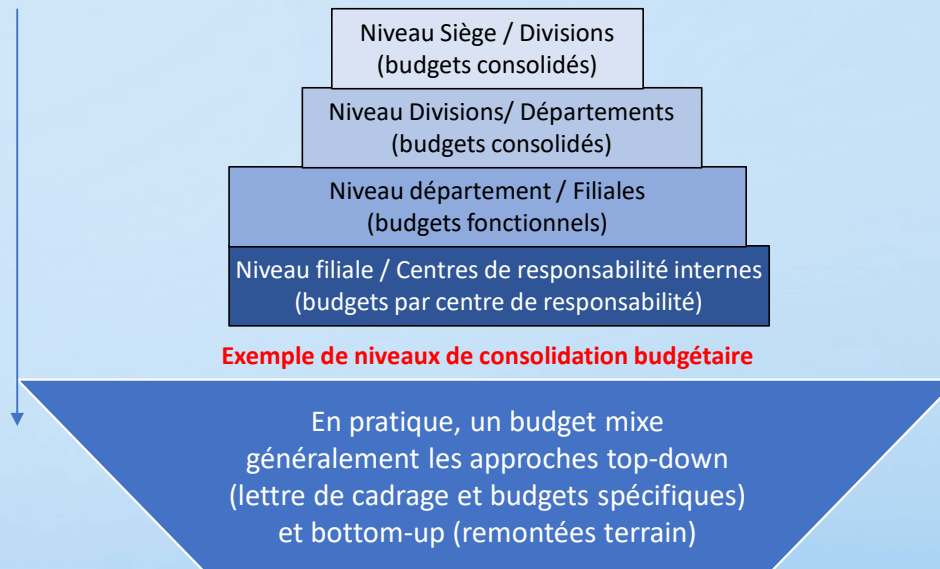


Approche bottom-up : budget élaboré par les managers (remontées terrain). Permet de responsabiliser les managers (ils s'engagent) et de prendre en compte leur expérience et leur vision de détail. Peut conduire à une vision inflationniste.

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.2 Le cycle et le calendrier budgétaire

- Les budgets, souvent annuels, sont détaillés par périodes plus courtes (mois) afin de repérer et analyser les écarts selon une périodicité adaptée à la durée du cycle de production et de procéder efficacement aux régulations qui s'imposent.

La hiérarchie budgétaire

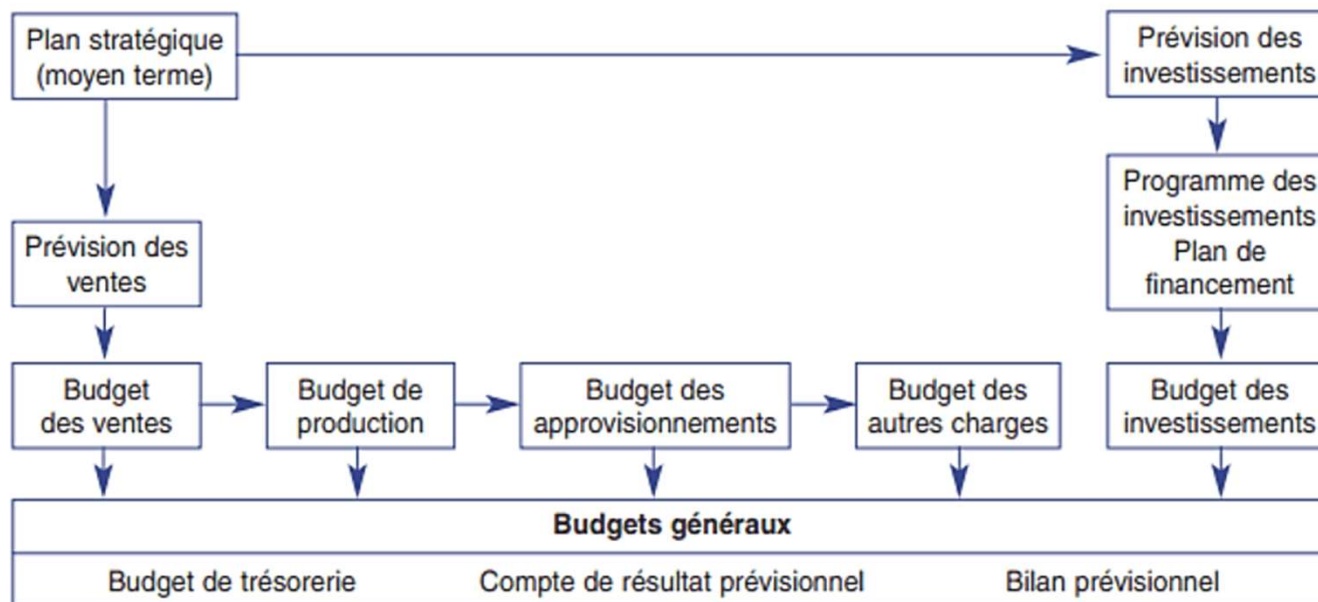

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget des ventes

Le budget des ventes représente le chiffre d'affaires prévisionnel pour une période de temps à venir

- ✓ En général, l'exercice comptable
- ✓ Décomposition par périodes plus courtes : le mois

Objectif : déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel

2 étapes pour établir le budget des ventes :

- Déterminer **les volumes** de vente prévisionnels (programme)
- Puis **en valeur** (budget)

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget des ventes - Méthodes statistiques

Deux grandes approches :

- L'extrapolation du passé :
L'analyse du passé permet de prévoir le futur = le trend
- L'approche directe du futur :
Remise en cause des tendances du passé

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget des ventes - Exemple

- Une société prépare les budgets du 2ième trimestre N
- Les programmes de ventes des 5 prochains mois sont les suivants :

• Avril	20 000 unités
• Mai	50 000 unités
• Juin	30 000 unités
• Juillet	25 000 unités
• Août	15 000 unités
- Le prix de vente unitaire est de 10 € HT

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget des ventes - Exemple

- Les prévisions des mois d'avril, mai et juin sont cumulées pour obtenir le total des ventes en volume (Q) et en valeur (€) du 2^{ième} trimestre de l'année N.

	Avril	Mai	Juin	Trimestre
Volume prévisionnel	20 000	50 000	30 000	100 000
Prix de vente unitaire HT	<u>€ 10</u>	<u>€ 10</u>	<u>€ 10</u>	<u>€ 10</u>
CA prévisionnel HT	<u>€ 200 000</u>	<u>€ 500 000</u>	<u>€ 300 000</u>	<u>€1 000 000</u>

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget de production

- Le budget de production dépend du volume des ventes et garantir le niveau souhaité de stock de produits fini de fin de période.
- Les étapes :
 1. Etablir le programme de production : quels produits, quels volumes à quel moment.
Le programme de production de chaque mois est lié aux volumes de ventes prévisionnelles, aux délais de fabrication, aux capacités de production, à la politique de sous-traitance et de stockage. Cette étape peut s'appuyer sur les outils de GPAO (Gestion de la Production Assistée par Ordinateur) qui gèrent les gammes et nomenclatures de production.
 2. Valoriser le programme de production (= établir le budget de production)
Il s'agit de chiffrer les ressources nécessaires dans le processus de fabrication des produits finis. Ce chiffrage repose sur les résultats de la comptabilité analytique. Il prend en compte les matières premières utilisées, la main d'œuvre directe de production et les autres coûts de production (variables, fixes, directs ou indirects)

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget des approvisionnements

- La fonction approvisionnement fournit les matières premières et les composants (entreprise industrielle) ou des marchandises (entreprises commerciales ou de négoce) en qualité et quantité suffisantes, au moment voulu et au coût le plus bas possible.
- Le programme d'approvisionnement dépend du programme de production et détermine :
 - les volumes
 - Les dates de commande des biens à acheter pour satisfaire les besoins.

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget des frais commerciaux

Budget de l'ensemble des charges à engager pour commercialiser les produits :

- Direction commerciale
- Force de vente (avec notamment la rémunération variable)
- Marketing
- Publicité et promotion

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget de Trésorerie

Établir le budget de trésorerie consiste à déterminer le montant de disponibilités prévisionnel à la fin de chaque période (mois, semaine ou jour).

- **Rôles :**

Cela permet à l'entreprise de :

- S'assurer que son exploitation dégage un excédent de trésorerie
- Anticiper une demande de crédit à court terme pour couvrir une insuffisance de disponibilités
- Vérifier que les délais de paiement accordés aux clients n'entraînent pas de dysfonctionnements et donc des coûts supplémentaires.

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget de trésorerie

Le budget de trésorerie centralise et récapitule toutes les conséquences financières des budgets précédents. Il reprend toutes les dépenses (sorties de trésorerie = décaissements) d'une période donnée ainsi que toutes les recettes (entrées en trésorerie = encaissements) de cette même période. Il est généralement établi mois par mois.

STRUCTURE DU BUDGET DE TRESORERIE :

	Janvier	Février	mars
Solde initial			
Encaissements prévus			
Décaissements prévus			
Solde final			

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget de trésorerie

Encaissements

- les encaissements des clients
- les nouveaux emprunts obtenus
- les nouveaux apports en numéraire de la part des actionnaires
- les subventions obtenues
- les dégrèvements d'impôts...

Décaissements

- les paiements de factures fournisseurs
- le paiement des investissements
- le paiement des salaires
- le paiement des charges sociales
- le paiement de la TVA
- le paiement des impôts et taxes
- les remboursements d'emprunts...

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Les prévisions d'encaissement (trésorerie)

- Pour réaliser le budget de trésorerie, il est nécessaire de déterminer les encaissements
- Règles d'encaissement du chiffre d'affaires :
 - 70% le mois de la vente,
 - 25% le mois suivant celui de la vente
 - 5% irrécouvrable
- La créance du 31 mars de 30 000 € sera encaissée en totalité en avril.

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Les prévisions d'encaissement (trésorerie)

- Attention : Nécessité d'avoir le chiffre d'affaires TTC pour déterminer le montant des encaissements d'où le tableau ci dessous

	Avril	Mai	Juin	Trimestre
Volume prévisionnel	20 000	50 000	30 000	100 000
Prix de vente unitaire	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10
CA prévisionnel HT	€ 200 000	€ 500 000	€ 300 000	€ 1 000 000
TVA 19,6%	39 200	98 000	58 800	196 000
CA prévisionnel TTC	239 200	598 000	358 800	1 196 000

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Les prévisions d'encaissement (trésorerie)

	Avril	Mai	Juin	Trimestre
Créance du 31/03	30 000			30 000
Prévisions d'encaissements				

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Les prévisions d'encaissement (trésorerie)

	Avril	Mai	Juin	Trimestre
Créance du 31/03	30 000			30 000
Ventes du mois d'avril				
70% x € 239 200	167 440			167 440
25% x € 239 200		59 800		59 800
Prévisions d'encaissements	<u>€ 197 440</u>			

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Les prévisions d'encaissement (trésorerie)

	Avril	Mai	Juin	Trimestre
Créance du 31/03	30 000			30 000
Ventes du mois d'avril				
70% x € 239 200	167 440			167 440
25% x € 239 200		59 800		59 800
Ventes du mois de mai				
70% x € 598 000		418 600		418 600
25% x € 598 000			149 500	149 500
Prévisions d'encaissements	<u>€ 197 440</u>	<u>€ 478 400</u>		

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Les prévisions d'encaissement (trésorerie)

	Avril	Mai	Juin	Trimestre
Créance du 31/03	30 000			30 000
Ventes du mois d'avril				
70% x € 239 200	167 440			167 440
25% x € 239 200		59 800		59 800
Ventes du mois de mai				
70% x € 598 000		418 600		418 600
25% x € 598 000			149 500	149 500
Ventes du mois de juin				
70% x € 358 800			251 160	251 160
Prévisions d'encaissements	<u>€ 197 440</u>	<u>€ 478 400</u>	<u>€ 400 660</u>	<u>€ 1 076 500</u>

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget de TVA

- L'entreprise collecte de la TVA sur les ventes qu'elle réalise, on parle de **TVA collectée**. Cette TVA facturée et encaissée par l'entreprise doit être reversée à l'état.
- Par ailleurs, l'entreprise dispose de **TVA déductible**, TVA sur les achats qu'elle a réalisés.
- Cette TVA déductible vient en diminution de la TVA que l'entreprise doit reverser à l'état.

TVA à décaisser = TVA collectée – TVA déductible

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget de TVA

- Il peut arriver que, sur une période, la TVA déductible soit supérieure à la TVA collectée. Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un crédit de TVA.
 - Dans certains cas, ce crédit de TVA sera remboursé à l'entreprise par l'état
 - La plupart du temps, ce crédit n'est pas remboursé mais peut être rajouté à la TVA déductible de la période suivante

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget de TVA - Exemple

	Janvier	Février	Mars
TVA collectée	18 000	15 000	20 000
TVA déductible	12 500	25 000	7 000
TVA à décaisser	5 500	0	3 000
Crédit de TVA		10 000	

Crédit de TVA déterminé au titre du mois de février et rajouté à la TVA déductible de mars pour déterminer la TVA à décaisser au titre de mars

TVA exigible en janvier d'après les règles fiscales. Par simplification, on supposera que la TVA facturée en janvier et donc collectée en janvier est totalement exigible au titre du mois de janvier.

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Le budget de TVA - Exemple

- **Ne pas confondre le mois de la déclaration de TVA et le mois de son paiement :**

- **Dans le budget de TVA**, on détermine le montant de la TVA à décaisser / crédit de TVA au titre de chacune des périodes. On ne s'occupe pas de la date de paiement de cette TVA.
- **Dans le budget de trésorerie**, on prendra en compte la date de paiement de la TVA à décaisser

La TVA à décaisser, calculé au titre du mois M, est versée à l'état au cours du mois M+1.

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

- Le contrôle budgétaire se définit comme « la comparaison permanente des résultats réels et des prévisions chiffrées figurant au budget afin :
 - De rechercher la (ou les) causes(s) d'écarts,
 - D'informer les différents niveaux hiérarchiques,
 - De prendre les mesures correctives éventuellement nécessaires,
 - D'apprécier l'activité des responsables budgétaires. »

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

- Chaque mois, les entreprises regardent les écarts entre les budgets et les réalisations

Mars N
Périmètre France

Coûts et recettes du centre de responsabilité								
	(A) Résultats du mois	(B) Objectif du mois (budget : ce qui fait foi) ou estimé	(A-B si recette ou B-A si coût) Ecart (en valeur absolue et en %)	(A') Résultats cumulés = year to date	(B') Objectifs cumulés (budget : ce qui fait foi) ou estimé	(A'-B') Ecart (en valeur absolue et en %)	(C) Budget annuel	(C-A') Reste à faire ou year to go
Rubrique 1 (ex : CA)								
- Indicateur 1a (ex : CA produit 1)	10 000 €	9 000 €	+1 000 € +11%	40 000 €	50 000 €	-10 000€ -20%	400 000 €	360 000 €
- Indicateur 1b (ex : CA produit 2)	12 000 €	13 000 €	-1 000 € -7,7%	38 000 €	40 000 €	-2000€ -5%	150 000 €	112 000 €
Rubrique 2 (ex : coûts de production)								
- Indicateur 2a (ex : coût matière)	5 000 €	6 000 €	-1 000€ -16%	15 000 €	16 000 €	- 1 000 € -6%	70 000 €	55 000 €
- Indicateur 2b (ex : coûts salariaux)	7 000 €	6 000 €	+ 1 000€ + 16%	21 000 €	20 000 €	+ 1 000 € +5%	84 000 €	63 000 €

Le reste à faire ou YTG (Year To Go) indique l'écart par rapport à l'objectif annuel. Il peut être utile de le comparer au RAF en % de l'an précédent

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire


3.3 Le contrôle budgétaire

- L'utilisation de coûts pré établis pour le budget de production en industrie :
- Les différentes méthodes de calcul des coûts présentées étaient basées sur des coûts constatés « a posteriori »
- Les coûts pré-établis : "la méthode consiste à comptabiliser les mouvements de valeurs à l'aide de coûts calculés à l'avance et à enregistrer les écarts résultant de la différence entre les valeurs ainsi dégagées et les valeurs réelles"
- Le coût standard constitue un type de coûts préétablis parmi d'autres (coûts budgétisés, coûts prévisionnels, devis)
 - Exemple : Une table des taux de devises (fixée une fois par an par le groupe à ses filiales) constitue un élément de calcul de coût pré établi.
- Coût standard théorique => utilisation la meilleure des facteurs de production
- Coût standard normal => utilisation normale des facteurs de production

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire – Le rôle des coûts préétablis

- Une évaluation rapide de la production obtenue et des stocks :
 - L'entreprise peut comptabiliser les coûts dès qu'elle connaît les quantités. Elle constatera ensuite un écart entre le coût imputé et le coût réel
- une gestion par exception
- Comparaison possible entre entités utilisant un même référentiel de coût unitaire
- favorise le mode de gestion décentralisée et la mesure des performances en recourant à la participation active des responsables pour l'établissement des prévisions et du budget et pour engager dans des délais réduits des actions correctrices

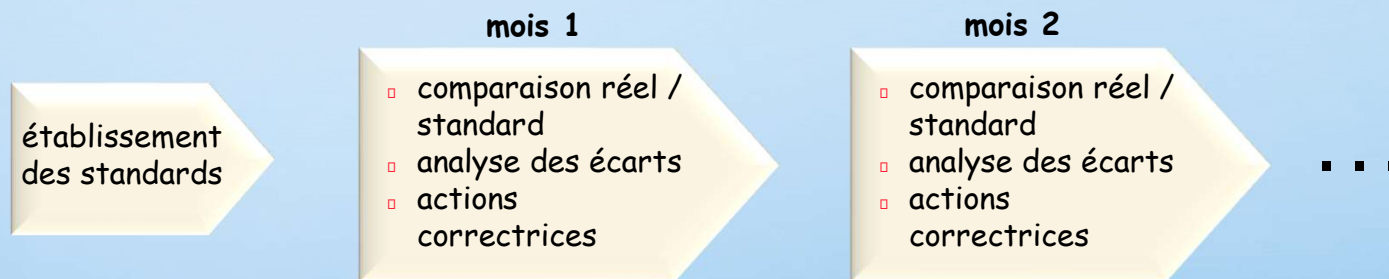

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire - Coûts Pré établis : le calcul du coût standard


$$\text{COUT STANDARD} = \text{QUANTITE STANDARD} \times \text{COUT UNITAIRE STANDARD}$$

Eléments	Coût unitaire préétabli	Qui	Quantités préétablies
Matières	Etude des coûts d'achat	Service des achats, comptabilité	Etude technique + % de rebut
Main d'œuvre directe	Estimation des salaires horaires	Service du personnel	Estimation des temps (productifs + entretien + inactivité)
Autres charges	Calcul des coûts préétablis des unités d'œuvre généralement à partir d'un budget correspondant à l'activité normale	Tous les services	Calcul des quantités d'unités d'œuvre sur base de l'activité normale ou de plein emploi

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

- L'exemple de la décomposition de l'écart sur résultat

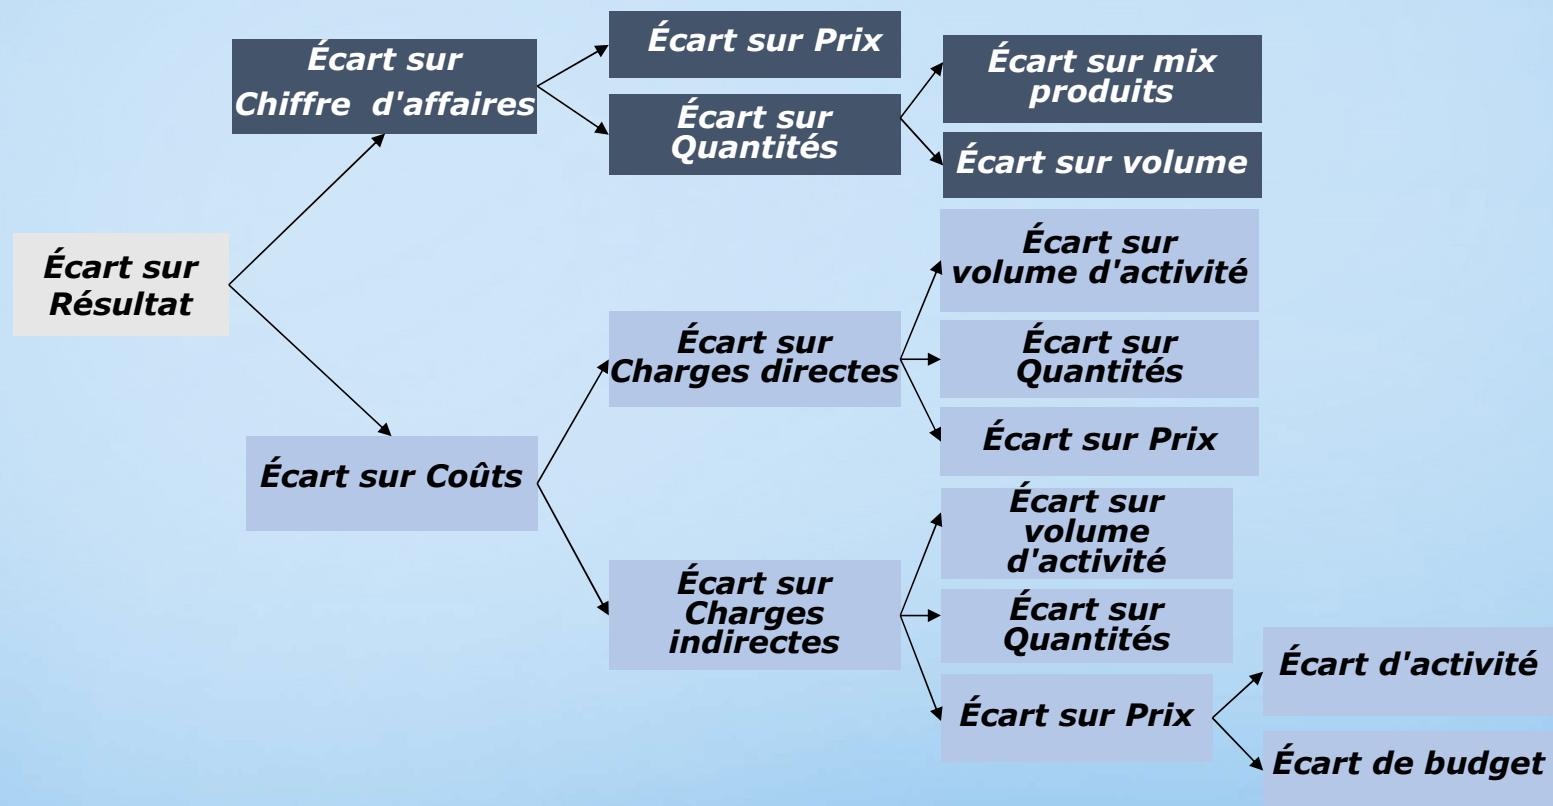


3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

L'exemple de l'analyse des écarts sur le chiffre d'affaires

Écart liés à :

- variation du prix de vente
- variation du volume
- modification dans le mix produits
- variation autres : retours

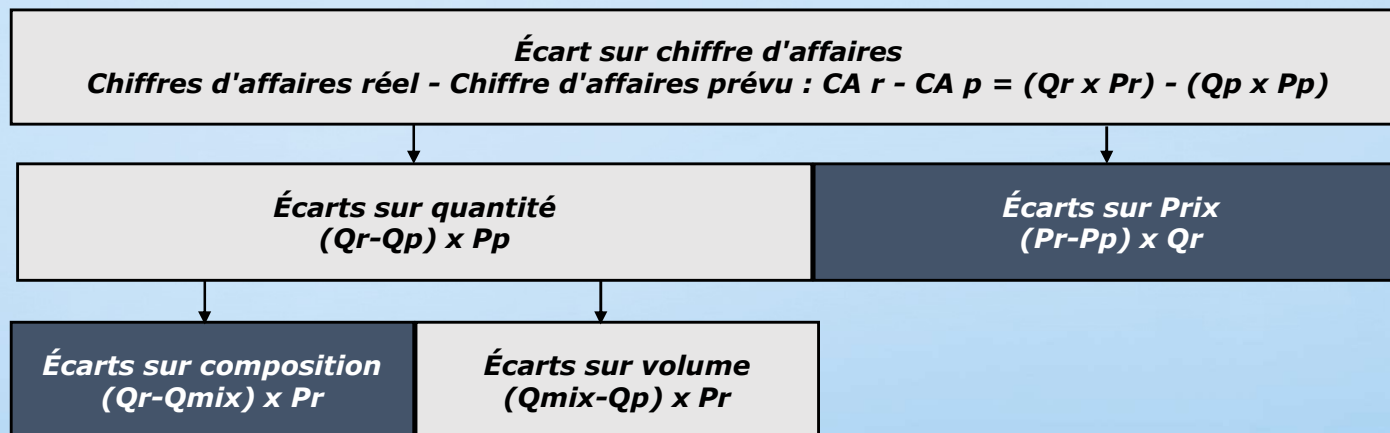


3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

L'exemple de l'analyse des écarts sur matière

- Les écarts peuvent être analysés en écarts sur quantités et en écarts sur coûts
 - écart sur quantité consommée : rendement de la matière
 - écart sur prix : impact de la variation de prix d'achat

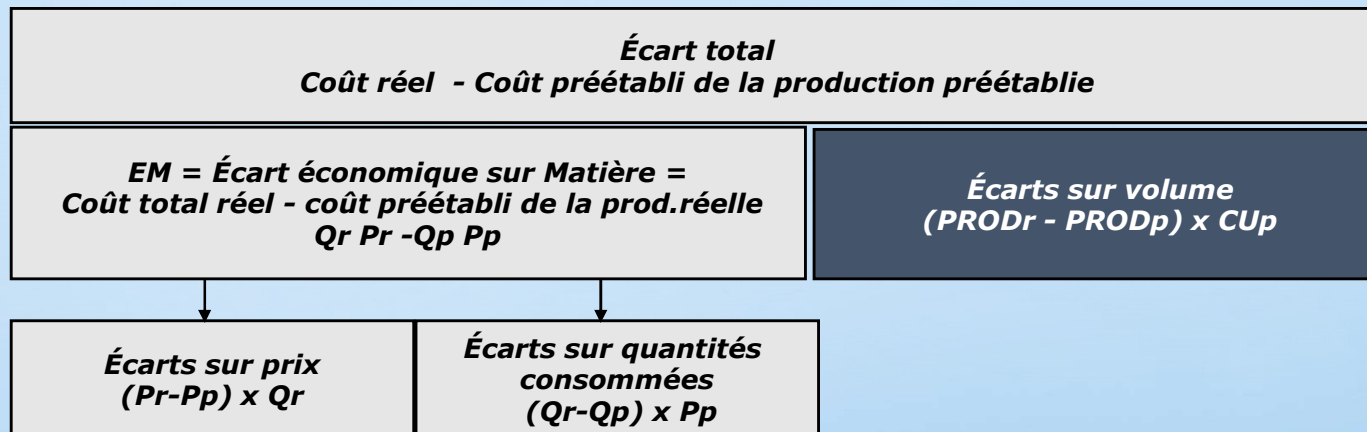

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

L'analyse des causes d'écarts sur matière

- Causes d'écarts
 - écarts sur matières consommées
 - mauvaise utilisation de la matière, excès de rebuts
 - standards mal calculés, écarts sur composition
 - mauvais entretien
 - écarts sur prix
 - mauvais choix de fournisseurs
 - mauvaises prévisions de ventes d'où mauvaises prévisions d'achats et de réapprovisionnement
 - variation des prix...

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

Exercice sur l'analyse des écarts sur matière

- **Données**

- la fabrication d'un produit nécessite selon les normes techniques 4 kg de matières à 8 €/ kg par unité produite
- En réel, 5 000 produits ont nécessité 22 000 Kg de matière qui ont coûté 198 000€.

- **Questions**

- Calculer le coût pré établi
- Calculer l'écart économique sur matière et l'expliquer

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

Exercice sur l'analyse des écarts sur matière

- Solution

$$Q_p = 4 \text{ kg} * 5\,000 \text{ unités} = 20\,000 \text{ kg}$$

$$\text{Coût préétabli} = 20\,000 * 8 \text{ €} = 160\,000 \text{ €}$$

- Calcul de l'Écart économique sur matière =

Écart Économique sur matière : $(Q_r - Q_p) \times P_p + (P_r - P_p) \times Q_r$

$$\begin{aligned} & \underbrace{(22\,000 - 20\,000) * 8}_{16\,000} + \underbrace{((198\,000/22\,000) - 8) * 22\,000}_{22\,000} \\ &= 16\,000 + 22\,000 \\ &= 38\,000 \end{aligned}$$

Écart > 0 => Écart défavorable :


- 16 000 écart sur quantités consommées
- 22 000 écart sur prix d'achat
- On peut déduire le coût réel par kg, soit 9€ et la quantité réelle, soit 4,4Kg

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

L'exemple de l'analyse des écarts sur main d'œuvre

- Les écarts peuvent être analysés en écarts sur temps et en écarts sur taux
 - écart sur temps : rendement du travail
 - écart sur taux horaire : impact de la variation du taux horaire

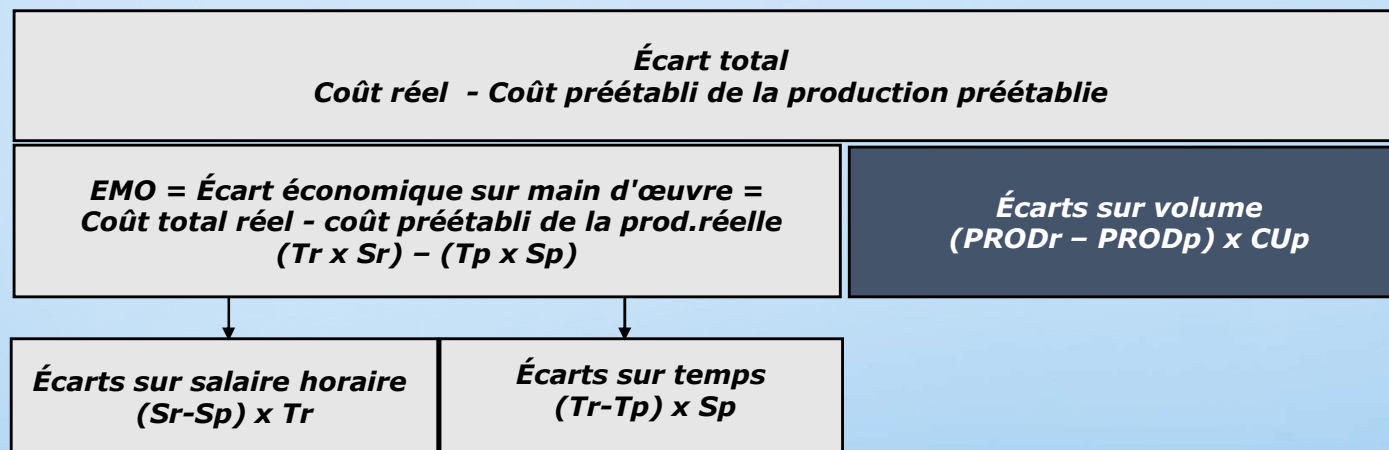

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

L'analyse des causes d'écarts sur main d'œuvre

- Causes d'écarts
 - écarts sur temps
 - chute des cadences, défaut d'encadrement, ...
 - standards mal calculés
 -
 - écarts sur salaire
 - excès d'heures supplémentaires
 - sur ou sous qualification de la main d'œuvre affectée à la production
 - augmentations légales non prévues
 - ...

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

3.3 Le contrôle budgétaire

Application du contrôle budgétaire / calcul d'écart.

La cas SEUROL



Feuille de calcul
Microsoft Excel

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Intérêts et limites de la gestion budgétaire

- **La procédure budgétaire** se caractérise par la hiérarchie et l'interdépendance des budgets (la prévision de production peut, selon les contraintes, conduire à un réajustement du budget des investissements ou du budget des ventes).
- **Les budgets généraux** permettent de traduire, sous forme chiffrée, la cohérence des prévisions ; équilibre de la trésorerie, rentabilité de l'exploitation (compte de résultat prévisionnel), équilibre financier (bilan prévisionnel).
 - En cas de déséquilibre, les responsables doivent procéder à des ajustements soit au sein de la période budgétaire soit en révisant les prévisions à moyen terme.
- Ainsi, la prévision budgétaire est un processus itératif qui conduit l'ensemble à la cohérence et à la sécurité (prévisions probabilistes).

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Intérêts et limites de la gestion budgétaire

- **Intérêt de la gestion budgétaire**

- La démarche de la prévision budgétaire permet une meilleure connaissance des atouts et faiblesses de l'entreprise et, par l'anticipation sur les réalisations, d'améliorer la réactivité de l'entreprise.
- Elle responsabilise et engage les personnels opérationnels.
- Elle force à la coordination des actions.

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Intérêts et limites de la gestion budgétaire

- **Limites de la gestion budgétaire**
- **La construction budgétaire se fonde, en grande partie, sur les modèles passés.** Elle risque de pérenniser des postes budgétaires non efficaces. C'est en particulier vrai pour l'ensemble des budgets fonctionnels.
- La désignation des responsabilités et le contrôle peuvent être mal vécus.
- Les évolutions de l'environnement peuvent rendre la construction budgétaire obsolète. La veille doit être constante afin d'adapter les programmes d'actions et les prévisions.


3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Intérêts et limites de la gestion budgétaire

Le processus budgétaire classique est en général long et mobilisateur d'énergie pour un résultat souvent éloigné de ses missions initiales

- L'encadrement intermédiaire cherche à limiter les objectifs sur lesquels il s'engage
- Il se préserve une marge de manœuvre sous forme de revenus sous-estimés ou de "matelas" de frais
- Une démarche descendante s'instaure pour compenser cette tendance et établir des prévisions répondant aux attentes de la Direction Générale
- L'encadrement opérationnel n'adhère plus à la démarche, se trouve dans un carcan d'objectifs imposés et se sent déresponsabilisé par cette instauration de micro-management

- Les décisions sont figées sur les 12 mois à venir
- L'organisation manque de capacité à réagir face aux événements imprévus
- La validation définitive intervient souvent après le début de l'exercice et pénalise alors les décisions d'investissement du premier trimestre



- La construction du budget est réalisée à un niveau de détail trop important
- Une logique analytique complexe (sections principales/secondaires, refacturations internes...) est reproduite au niveau du budget
- Les prévisions sont établies en reconduction de références historiques au détriment de la qualité d'analyse

- Les données à agréger sont peu uniformes dans leur présentation comme dans leur fiabilité
- Elles sont stockées sous forme de tableur et de manière peu sécurisée à tous les niveaux de la construction budgétaire
- Les navettes entre les opérationnels et la Direction Générale sont nombreuses, elles sont rendues laborieuses voire complexes par les étapes de ressaisie et la gestion des versions intermédiaires
- Le contrôle de gestion passe l'essentiel de son temps à agréger et à vérifier les informations et peu de temps à simuler des scénarios et à analyser les prévisions



La pratique

3- L'élaboration et le contrôle budgétaire

Intérêts et limites de la gestion budgétaire

Les développements technologiques récents et les nouvelles pratiques permettent de fluidifier le processus budgétaire classique

